

**ОБОВОЩЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТИ: от 1 до 16: ДАИ**


№	Основни обекти	к.дни	Месец 1			Месец 2			Месец 3			Месец 4			Месец 5			Месец 6		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Белико Търново	29.0																		
2	Видин	24.0																		
3	Враца	29.0																		
4	Габрово	29.0																		
5	Добрич	24.0																		
6	Кюстендил	29.0																		
7	Ловеч	22.0																		
8	Монтана	19.0																		
9	Първомай	19.0																		
10	Разград	27.0																		
11	Сливен	24.0																		
12	София	7.0																		
13	Търговище	25.0																		
14	Хасково	28.0																		
15	Шумен	40.0																		
16	Ямбол	29.0																		

Продължителност на изпълнение на СМР за всички обекти: 83 (осемдесет и три) календарни дни

Забележка: Крайния срок посочен в обобщения линейен график се базира на последователността на изпълнение на така показаните отделни обекти

Дата: 19.11.2015

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД
инж.Петър Василев
/подпис и печат/



A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'S. J. ...'. The stamp is a rectangular box containing text, including 'S. J.' and '1991'.


**КАЛЕНДАРЕН ГРА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЕКТ 1: ДАИ, гр. Велико**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	Вътрешен ремонт							
1	Изнасяне и внасяне на мебели	ч/ч	20,00	4	2	2,0	2	
2	Покриване на под с полиетилен	м ²	50,00	1	1	1,0		1
3	Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм.	м ²	45,00	6	2	3,0		2
4	Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни	м	75,00	6	2	3,0		
5	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	480,00	10	2	5,0		
6	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	220,00	10	2	5,0		
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	480,00	10	2	5,0		
8	Боядисване с бял латекс по тавани	м ²	180,00	10	2	5,0		
9	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	300,00	10	2	5,0		
10	Демонтаж на осветителни тела	бр.	15,00	2	2	1,0	2	
11	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	15,00	2	2	1,0		
12	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	15,00	6	2	3,0		
13	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметише	м ³	15,00	10	2	5,0		
15	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	160,00	4	2	2,0		
	СМР по фасади							
1	Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета	м	66,00	2	2	1,0		
2	Демонтаж на поцинкована ламарина по покривен борд	м	66,00	4	2	2,0		
3	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламаринена по бордове	м	66,00	4	2	2,0		
4	Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати	м	100,00	4	1	4,0		
5	Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати	м	88,00	4	1	4,0		
6	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS -4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м ²	80,00	8	2	4,0		
7	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м ²	80,00	8	2	4,0		
8	Демонтаж на поцинковани улуци със запазване	м	66,00	2	2	1,0		
9	Монтаж на поцинковани улуци със запазване	м	66,00	4	2	2,0		
10	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване	м	28,00	4	2	2,0		
11	Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м	28,00	4	2	2,0		
12	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м ²	450,00	30	3	10,0		
13	Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м	80,00	4	1	4,0		
14	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS	м ²	450,00	30	3	10,0		
15	Тръбно фасадно скеле	м ²	455,00	18	3	6,0		
16	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	25,00	12	2	6,0		
17	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметише	м ³	25,00	12	2	6,0		
18	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	420,00	12	2	6,0		

4 3


Продължителност на изпълнение на СМР: 29 (двадесет и девет) календарни дни

Диаграма на работната ръка

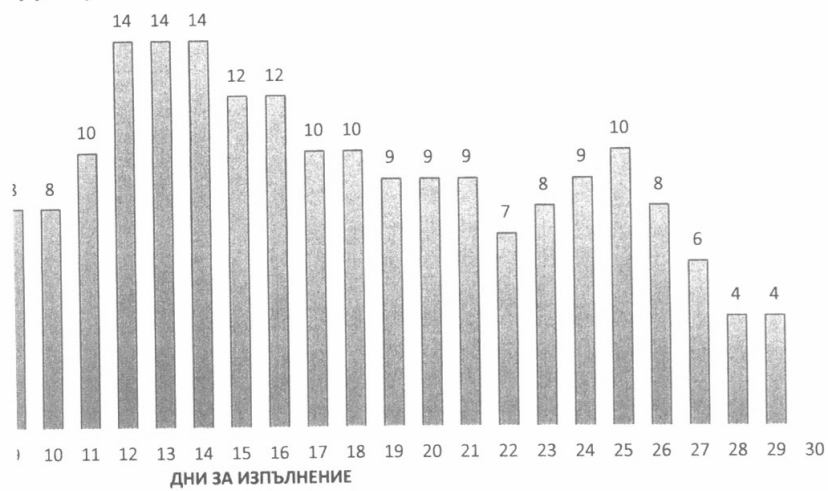

"ЕООД


инж.Петър Василев
/подпис и печат/



Handwritten signature.

Handwritten signature.

015

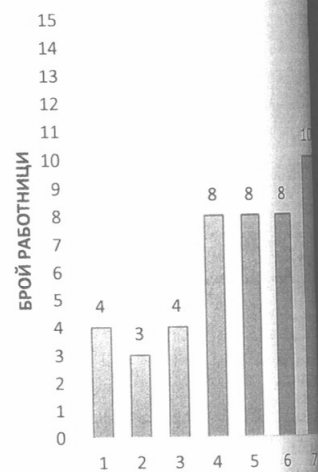


Управител, "Метр"

**КАЛЕНДАРЕН ГРАС
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЕКТ 2: ДАИ, гр. Вид**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци				
						к.дни	1	2	3
	Вътрешен ремонт								
1	Покриване на под с полиетилен	м2	50,00	1	1	1,0	1		
2	Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм.	м2	21,80	4	2	2,0	2	2	
3	Демонтаж на дървена врата	бр	1,00	2	2	1,0		2	
4	Доставка и монтаж на ламинатна врата 80/200	бр	1,00	2	2	1,0		2	
5	Доставка и монтаж на врати- AL профил с термопанел	м2	4,50	2	2	1,0			
6	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W с ЕИРА	бр.	20,00	2	2	1,0			2
7	Доставка и монтаж на AL щори - хоризонтални ламели	м2	21,80	2	2	1,0			
8	Оформяне на ръбове с гипс и AL лайсни	м	40,00	2	2	1,0			2
9	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м3	3,00	2	2	1,0			
10	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м3	3,00	2	2	1,0			
11	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м2	50,00	2	2	1,0			
	СМР по фасади								
1	Очукване на подкожушена мазилка по фасада	м2	50,00	6	2	3,0			
2	Тръбно фасадно скеле	м2	300,00	9	3	3,0			
3	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м2	280,00	12	3	4,0			
4	Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м	100,00	3	1	3,0			
5	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS	м2	480,00	18	3	6,0			
6	Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати	м	100,00	3	1	3,0			
7	Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати	м	55,00	3	1	3,0			
8	Демонтаж на поцинковани улици със запазване	м	58,00	4	2	2,0			
9	Монтаж на поцинковани улици със запазване	м	58,00	4	2	2,0			
10	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване	м	28,00	4	2	2,0			
11	Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м	28,00	6	2	3,0			
12	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м2	96,00	6	2	3,0			
13	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м2	96,00	6	2	3,0			
14	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м2	31,50	6	2	3,0			
15	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м3	10,00	4	2	2,0			
16	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м3	10,00	4	2	2,0			
17	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м2	100,00	2	2	1,0			

3 6 4

Продължителност на изпълнение на СМР: 24 (двадесет и четири) календарни дни




Дата: 19.11.2015

Упра

[Handwritten signature]

Диаграма на работната ръка

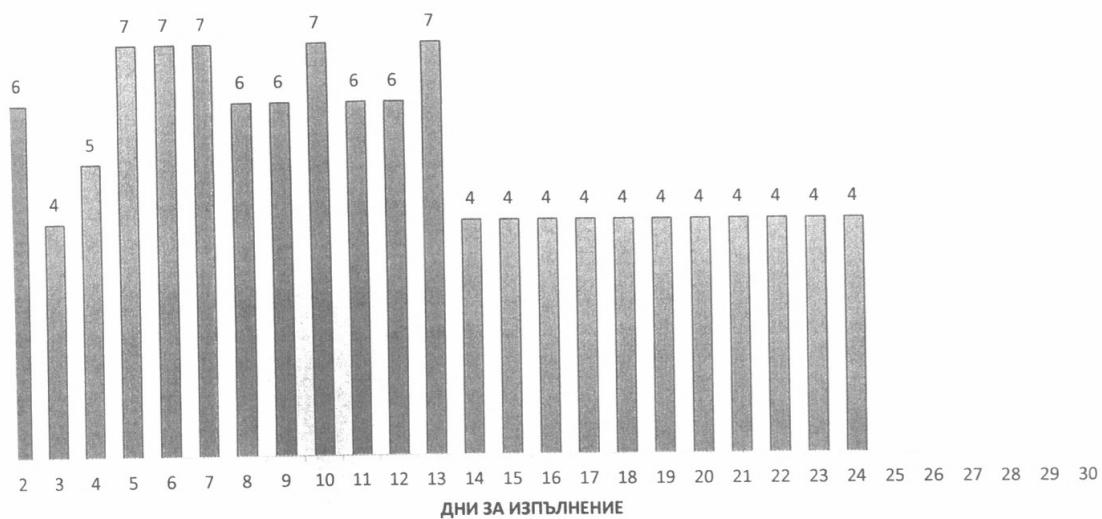

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж.Петьо Василев

/подпис и печат/




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМ
ОБЕКТ 3: ДАИ, гр. Враца**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци					
						к.дни	1	2	3	4
Вътрешен ремонт										
1	Изнасяне и внасяне на мебели	ч/ч	12	1	1	1,0				
2	Демонтаж на дървена ламперия	м ²	80	4	2	2,0				
3	Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка	м ²	80	4	2	2,0				
4	Демонтаж на ключове	бр	5	1	1	1,0				
5	Демонтаж на контакти	бр	15	1	1	1,0				
6	Демонтаж на осветителни тела	бр	38	2	2	1,0				
7	Покриване на под с полиетилен	м ²	100	1	1	1,0				
8	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	355	8	2	4,0				
9	Грундиране с дълбоко проникващ грунд	м ²	355	10	2	5,0				
10	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	50	6	2	3,0				
11	Боядисване с бял латекс по тавани	м ²	110	6	2	3,0				
12	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	245	6	2	3,0				
13	Направа на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция	м ²	80	6	2	3,0				
14	Шпакловка с гипсово лепило по стени от гипсокартон	м ²	80	6	2	3,0				
15	Направа на самонивелираща замазка	м ²	80	4	2	2,0				
16	Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас AC-32	м ²	80	4	2	2,0				
17	Доставка и монтаж на PVC первази	м	78	1	1	1,0				
18	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5 мм2	м	200	4	2	2,0				
19	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2	м	150	2	1	2,0				
20	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	50	3	1	3,0				
21	Доставка и монтаж на контакти "Шуко" за скрит монтаж в гипсокартон	бр.	15	2	2	1,0				
22	Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж в гипсокартон	бр.	5	2	2	1,0				
23	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	38	2	2	1,0				
24	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	5	1	1	1,0				
25	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	5	1	1	1,0				
26	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	200	1	1	1,0				
Ремонт на покрив- плосък покрив										
1	Товарене, разтоварване и пълнене на съществуващи отпадъци в чували	м ³	1	2	2	1,0				
2	Извозване на съществуващи смесени отпадъци с включени такси сметище	м ³	1	2	2	1,0				
3	Демонтаж на стара хидроизолация от битумни мушамы	м ²	250	6	2	3,0	2	2		
4	Демонтаж на ламарина по борд	м ²	25	4	2	2,0		2	2	
5	Направа на изравнителна армирана цименто-пясъчна замазка до 4 см.	м ²	250	4	2	2,0			2	2
6	Направа на холкер от вароциментов разтвор	м	70	4	2	2,0				2
7	Доставка и полагане на хидроизолация APP - два пласта на газопламъчно лепене, втория пласт с посипка включително грунд	м ²	250	6	2	3,0				
8	Доставка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина, по борд	м ²	25	2	2	1,0				
9	Направа на шапки от поц. ламарина на комини	м ²	3	1	1	1,0				
10	Измазване на комин с варициментова мазилка включително качване на материалите	м ²	5	1	1	1,0				
11	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	15	4	2	2,0				
12	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	15	4	2	2,0				
13	Почистване на строителня площадка и прилежащи площи	м ²	100	2	2	1,0				
							2	4	4	




Дата: 19.11.2015

Упра


[Handwritten signature]

Диаграма на работната ръка

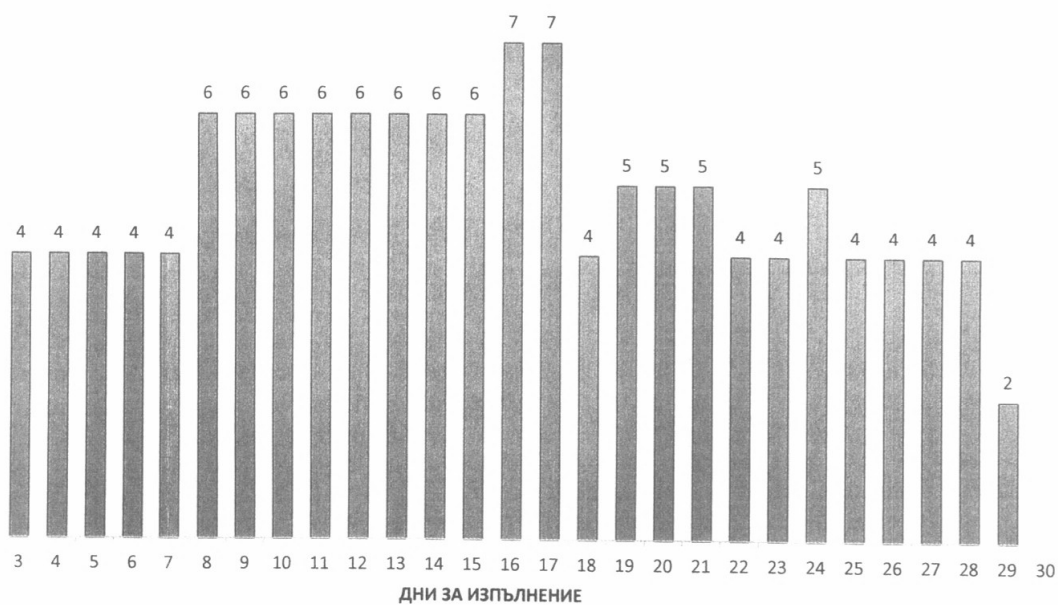

правител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж.Петьо Василев
/подпис и печат/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КАЛЕНДАРЕН ГИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ОБЕКТ 4: ДАИ, гр. И

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	Вътрешен ремонт							
1	Покриване на под с полиетилен	м2	110,00	1	1	1,0		1
2	Демонтаж на мокет с изчистване на лепилото от подовата замазка	м2	60,00	2	2	1,0	2	
3	Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка	м2	40,00	2	2	1,0	2	
4	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	462,00	27	3	9,0		3
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	462,00	12	2	6,0		
6	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	210,00	12	3	4,0		
7	Боядисване с бял латекс по тавани	м2	155,00	15	3	5,0		
8	Боядисване с цветен латекс по стени	м2	307,00	15	3	5,0		
9	Демонтаж на осветителни тела	бр.	30,00	4	2	2,0		
10	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	30,00	6	2	3,0		
11	Изнасяне и внасяне на мебели	ч/ч	10,00	4	2	2,0	2	
12	Стъргане на боя по ламперия	м2	65,00	6	2	3,0		2
13	Лакиране на ламперия с корабен лак	м2	65,00	4	2	2,0		
14	Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лисни	м	50,00	4	2	2,0		
15	Демонтаж на контакти	бр.	30,00	2	2	1,0		
16	Доставка и монтаж на контакти "Шуко", двоен	бр.	30,00	2	2	1,0		
17	Демонтаж на ключове	бр.	12,00	2	2	1,0		
18	Доставка и монтаж на ключове	бр.	12,00	2	2	1,0		
19	Подмяна на панти, брава, патрон и дръжка на дървена врата	бр.	12,00	2	2	1,0		
20	Направа на самонивелираща замазка	м2	100,00	4	2	2,0		
21	Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас AC-32	м2	100,00	4	2	2,0		
22	Доставка и монтаж на PVC первази	м	88,00	1	1	1,0		
23	Стъргане на блажна боя по стари дървени врати	м2	62,40	9	3	3,0		
24	Полагане на блажна боя по стари дървени врати	м2	62,40	6	2	3,0		
25	Демонтаж на щори	м2	10,00	2	2	1,0		
26	Доставка и монтаж на щори -AL, хоризонтални ламели	м2	10,00	2	2	1,0		
27	Подмяна на стара дървена догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм.	м ²	8,90	2	2	1,0		
28	Стъргане по цокъл на блажна боя	м2	10,00	6	2	3,0		
29	Полагане на блажна боя по цокъл	м2	10,00	4	2	2,0		
30	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м3	10,00	4	2	2,0		
31	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметише	м3	10,00	6	2	3,0		
32	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м2	120,00	6	2	3,0		


6 6

Продължителност на изпълнение на СМР: 29 (двадесет и девет) календарни дни




[Handwritten signature]

Диаграма на работната ръка

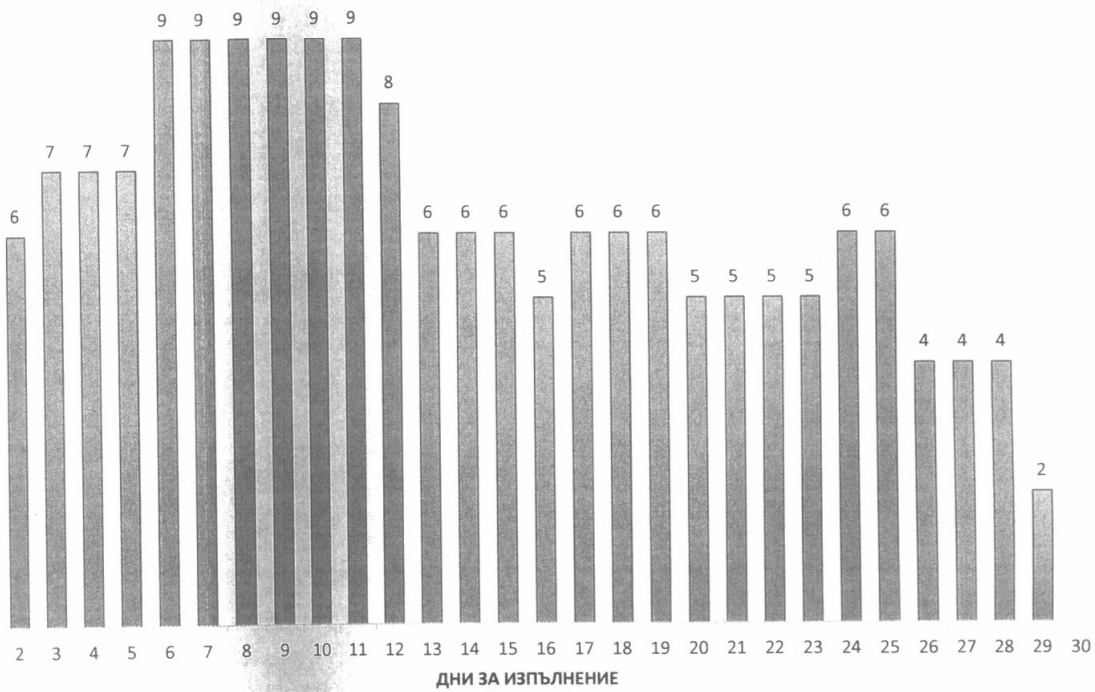


Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж. Петър Василев
/подпис и печат/



[Handwritten signature]

Дата: 19.11.2015



**КАЛЕНДАРЕН ГРАФ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА С
ОБЕКТ 5: ДАИ, гр. Добр**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци					
						к.дни	1	2	3	4
	Вътрешен ремонт									
1	Изнясяне на мебели от етаж	м3	19,00	4	2	2,0	2	2		
2	Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVCпрофил, цвят бял, стъклопакет 24 мм	м2	57,00	4	2	2,0		2	2	
3	Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка	м2	196,00	4	2	2,0		2	2	
4	Демонтаж на мокет с изчистване на лепилото от подовата замазка	м2	20,00	2	2	1,0				2
5	Демонтаж на кабел канали	м	150,00	1	1	1,0				
6	Демонтаж на ключове	бр	25,00	1	1	1,0				
7	Демонтаж на контакти	бр	35,00	1	1	1,0				
8	Демонтаж на осветителни тела	бр	60,00	4	2	2,0				
9	Демонтаж на тапети	м2	28,00	1	1	1,0				
10	Демонтаж на дървена ламперия	м2	75,00	4	2	2,0				2
11	Демонтаж на метално Ел табло	бр	2,00	1	1	1,0				
12	Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни	м	120,00	4	2	2,0				
13	Демонтаж на дървена врата	бр	15,00	4	2	2,0				
14	Демонтаж на фаянсови плочки	м2	20,00	4	2	2,0				
15	Демонтаж на теракотни плочки	м2	6,00	1	1	1,0				
16	Направа на изравнителна армирана цименто -пясъчна замазка до 4 см.	м2	6,00	1	1	1,0				
17	Доставка и полагане на теракотни плочки по под	м2	6,00	1	1	1,0				
18	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	20,00	2	1	2,0				
19	Вароциментова мазилка по стени	м2	20,00	2	1	2,0				
20	Доставка и полагане на фаянсови плочки по стени	м2	20,00	2	1	2,0				
21	Демонтаж на мивка в санитарно помещение	бр.	4,00	1	1	1,0				
22	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола	бр.	4,00	1	1	1,0				
23	Демонтаж на тоалетна чиния и казанче	бр.	4,00	1	1	1,0				
24	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	4,00	1	1	1,0				
25	Демонтаж на смесителни батерии	бр.	4,00	1	1	1,0				
26	Доставка и монтаж на смесителни батерии	бр.	4,00	1	1	1,0				
27	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м2	920,00	24	3	8,0				3
28	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	920,00	24	3	8,0				
29	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	540,00	24	3	8,0				
30	Боядисване сбял латекс по тавани	м2	350,00	9	3	3,0				
31	Боядисване с цветен латекс по стени	м2	570,00	18	3	6,0				
31	Направа на преградна стена от гипсокартон на метална конструкция	м2	134,00	8	2	4,0				
32	Направа на самонивелираща замазка	м3	196,00	6	2	3,0				
33	Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас AC-32	м2	196,00	6	2	3,0				
34	Доставка и монтаж на PVC превази	м	180,00	6	2	3,0				
35	Доставка и монтаж на врати –AL профил с термопанел	м2	27,00	4	2	2,0				
36	Шлайфане и полиране на мозайка	м2	91,10	4	2	2,0				
37	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	50,00	4	2	2,0				
38	Доставка и монтаж на контакти "Шуко" за скрит монтаж в гипсокартон	бр.	35,00	4	2	2,0				
39	Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж в гипсокартон	бр.	25,00	4	2	2,0				
40	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	60,00	4	2	2,0				
41	Доставка и монтаж на кабелканали 40x25 мм.	м	150,00	2	1	2,0				
42	Доставка и монтаж на апартаментно Ел. табло 8P, PVC, открит монтаж	бр	2,00	1	1	1,0				
43	Доставка и монтаж на АП 25А, 1Р	бр.	8,00	1	1	1,0				
44	Доставка и монтаж на DIN шина	м	0,40	1	1	1,0				
45	Доставка и монтаж на нулева шина	м	0,40	1	1	1,0				
46	Доставка и монтаж на шина земя	м	0,40	1	1	1,0				
47	Доставка и монтаж на 1Р гребен	м	0,40	1	1	1,0				

DESIGN


THE

Handwritten marks: A large 'X' and a signature.

48	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м3	20,00	6	2	3,0			
49	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м3	20,00	4	2	2,0			
50	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м2	250,00	4	2	2,0			

2 6 4


Продължителност на изпълнение на СМР:24 (двадесет и четири) календарни дни



Дата: 19.11.2015

Уп

Диаграма на работната ръка

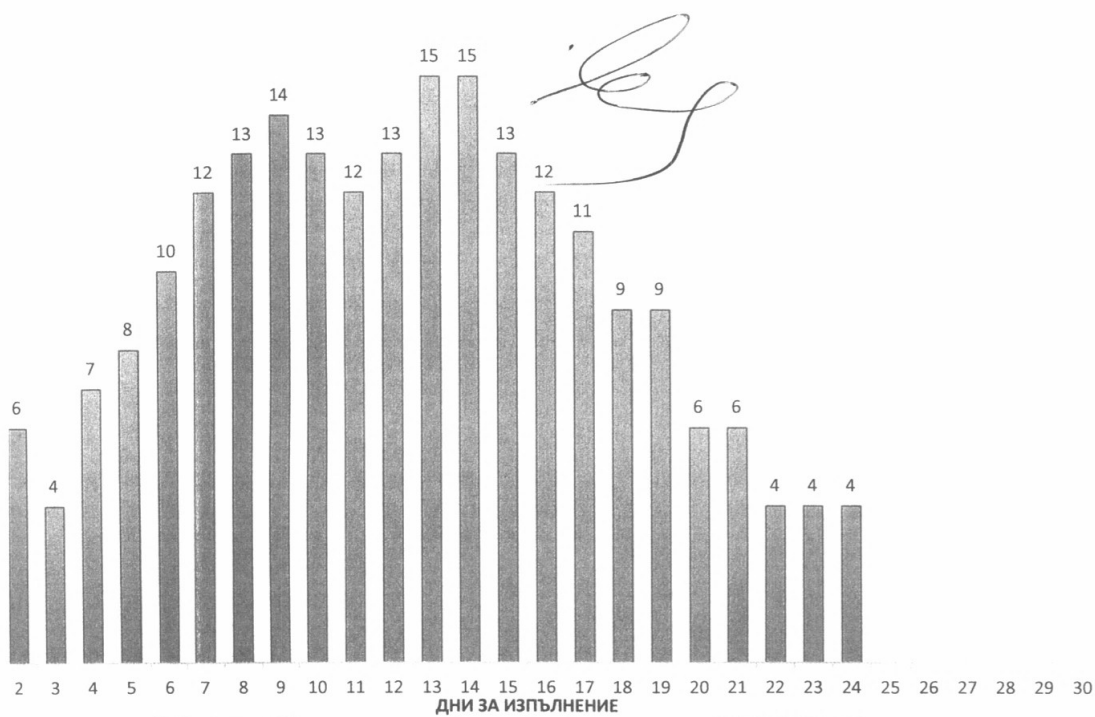

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД


КАЛЕНДАРЕН П
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ОБЕКТ 6: ДАИ, гр. К

Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
					к.дни	1	2
Ремонт I, II и III етаж							
Демонтаж на радиатор	бр.	34	4	2	2,0	2	2
Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка	м²	315	6	2	3,0		
Демонтаж дървени первази	м	280	6	2	3,0		
Изнасяне и внасяне на мебели	м³	80	6	2	3,0	2	2
Стъргане на постна боя от стени и тавани	м²	1333	6	2	3,0		
Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм	м²	116,6	6	2	3,0		
Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни	м	477	9	3	3,0		
Гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	1333	80	5	16,0		
Подмяна на входни врати с нова -Al студен профил стъклопакет 24 мм	м²	54	6	2	3,0		
Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м²	1333	45	3	15,0		
Боядисване с бял латекс по тавани	м²	385	15	3	5,0		
Боядисване с цветен латекс по стени	м²	948	21	3	7,0		
Направа на самонивелираща замазка	м³	315	6	2	3,0		
Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас AC-32	м²	315	6	2	3,0		
Доставка и монтаж на PVC первази	м	280	6	2	3,0		
Демонтаж на ламперия	м²	107	4	2	2,0		
Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон наметална конструкция	м²	107	8	2	4,0		
Демонтаж на щори	м²	106,6	4	2	2,0		
Доставка и монтаж на хоризонтални AL щори	м²	106,6	4	2	2,0		
Демонтаж на моноблок	бр.	4	1	1	1,0		
Доставка и монтаж на моноблок	бр.	4	1	1	1,0		
Демонтаж на мивка	бр.	4	1	1	1,0		
Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола	бр.	4	1	1	1,0		
Товарене, разтоварване и пълнене на съществуващи отпадъци в чували	м³	30	9	3	3,0		
Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м³	30	9	3	3,0		
Почистване на помещения	м²	60	1	1	1,0		
Демонтаж на смесителни батерии	бр.	4	1	1	1,0		
Доставка и монтаж на смесителни батерии	бр.	4	1	1	1,0		
Фасади и стълбище							
Тръбно фасадно скеле	м²	570	30	3	10,0		
Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м²	570	21	3	7,0		
Демонтаж на поцинковани улици със запазване	м	70	4	2	2,0		
Монтаж на поцинковани улици със запазване	м	70	4	2	2,0		
Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване	м	28	4	2	2,0		
Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м	28	4	2	2,0		
Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м²	84	6	2	3,0		
Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м²	84	6	2	3,0		
Доставка и монтаж на Al външни подпрозоръчни первази 25 см.	м	120	4	2	2,0		
Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати	м	70	6	2	3,0		
Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати	м	90	6	2	3,0		
Доставка и монтаж на нови барабани	бр	4	1	1	1,0		
Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м	250	6	2	3,0		
Демонтаж на климатици със запазване	бр.	10	4	2	2,0		
Монтаж на климатици със запазване	бр.	10	4	2	2,0		
Направа на цименто-пясъчна замазка по под с дебелина до 4 см.	м²	25	4	2	2,0		
Доставка и монтаж на плочки от гранитогрес	м²	25	4	2	2,0		

18	Доставка и монтаж на дървени плоскости за стъпала по метална стълба	м ²	15	4	2	2,0		
19	Направа на хидроизолация от битумни керемиди по дървен покрив /навес/, вкл. грундиране	м ²	50	6	2	3,0		
20	Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци	м ³	30	9	3	3,0		
21	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	30	9	3	3,0		
22	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	200	6	2	3,0		
23	Блажно боядисване на метални гаражни врати с предврително почистване на ръжда и грундиране	м ²	15	2	2	1,0		
Електроинсталации:								
1	Демонтаж на ЛОТ 2x18W	бр.	51	4	2	2,0	2	2
2	Демонтаж на ключове	бр.	22	2	2	1,0		
3	Демонтаж на контакти	бр.	35	2	2	1,0		
4	Демонтаж на ел.табло	бр.	3	1	1	1,0		
5	Демонтаж на разклонителни кутии	бр.	50	2	2	1,0		
6	Демонтаж на кабели /съществуващи/	м	550	8	2	4,0		
7	Направа на улеи за вкопаване на кабели	м	550	6	2	3,0		
8	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2	м	350	6	2	3,0		
9	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5 мм2	м	200	4	2	2,0		
10	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	50	4	2	2,0		
11	Доставка и монтаж на апартаментно ел.табло 24Р, с включена апаратура	бр.	3	4	2	2,0		
12	Доставка и монтаж на контакти "Шуко"	бр.	35	6	2	3,0		
13	Доставка и монтаж на ключове за осветление	бр.	22	4	2	2,0		
14	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	51	4	2	2,0		
15	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	57	4	2	2,0		

6 10

Продължителност на изпълнение на СМР: 29 (двадесет и девет) календарни дни



Дата: 19.11.2015


КАЛЕНДАРЕН ГРА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЕКТ 7: ДАИ, гр. Л

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци				
						к.дни	1	2	3
	Вътрешен ремонт								
1	Изнасяне и внасяне на мебели	ч/ч	10,00	4	2	2,0	2		
2	Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка	м ²	115,00	2	1	2,0	1	1	
3	Подмяна на стара дървена догрма с нова - петкамерен PVCпрофил, цвят бял, стъклопакет 24 мм	м ²	29,90	4	2	2,0			2
4	Стъргане на блажна боя по стари дървени врати	м ²	41,60	4	2	2,0			2
5	Полагане на блажна боя по стари дървени врати	м ²	55,20	4	2	2,0			
6	Подмяна на панти брава, патрон дръжки на дървена врата	бр	8,00	1	1	1,0			
7	Демонтаж на фаянсови плочки	м ²	8,00	1	1	1,0			
8	Демонтаж на теракотни плочки	м ²	3,10	1	1	1,0			
9	Демонтаж на ключове	бр	8,00	1	1	1,0			
10	Демонтаж на контакти	бр	19,00	1	1	1,0			
11	Демонтаж на осветителни тела	бр	15,00	2	2	1,0			
12	Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лансни	м	60,00	4	2	2,0			
13	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	427,00	15	3	5,0			
14	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	212,00	12	3	4,0			
15	Външна шпакловка с теракол	м ²	20,00	1	1	1,0			
16	Боядисване с бял латекс по тавани	м ²	95,00	4	2	2,0			
16	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	332,00	9	3	3,0			
17	Направа на самонивелираща замазка	м ²	115,00	4	2	2,0			
18	Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас AC-32	м ²	115,00	4	2	2,0			
19	Доставка и монтаж на PVC превази	м	110,00	4	2	2,0			
20	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	15,00	4	2	2,0			
21	Доставка и монтаж на ключове	бр.	8,00	4	2	2,0			
22	Доставка и монтаж на контакти "Шуко", двоен	бр.	19,00	4	2	2,0			
23	Смяна на пана за окачен таван тип "Армстронг"	бр.	20,00	4	2	2,0			
24	Вароциментова мазилка по стени	м ²	8,00	1	1	1,0			
25	Направа на изравнителна армирана циментопясъчна замазка до 4 см.	м ²	3,10	1	1	1,0			
26	Доставка и полагане на теракотни плочки	м ²	3,10	1	1	1,0			
27	Доставка и полагане на фаянсови плочки	м ²	8,00	1	1	1,0			
28	Демонтаж на мивка	бр.	1,00	1	1	1,0			1
29	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с конзола	бр.	1,00	1	1	1,0			1
30	Демонтаж на тоалетна чиния и казанче	бр.	1,00	1	1	1,0			
31	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	1,00	1	1	1,0			
32	Демонтаж на смесителни батерии	бр.	1,00	1	1	1,0			
33	Доставка и монтаж на смесителни батерии	бр.	1,00	1	1	1,0			
34	Направа на козирка и две прегради от поликарбонат на метална конструкция	м ²	14,00	4	2	2,0			
35	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	10,00	4	2	2,0			
36	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	10,00	4	2	2,0			
37	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	130,00	4	2	2,0			

3 3 4

Продължителност на изпълнение на СМР:22 (двадесет и два) календарни дни


Дата: 19.11.2015



У

[Handwritten signature]

Диаграма на работната ръка

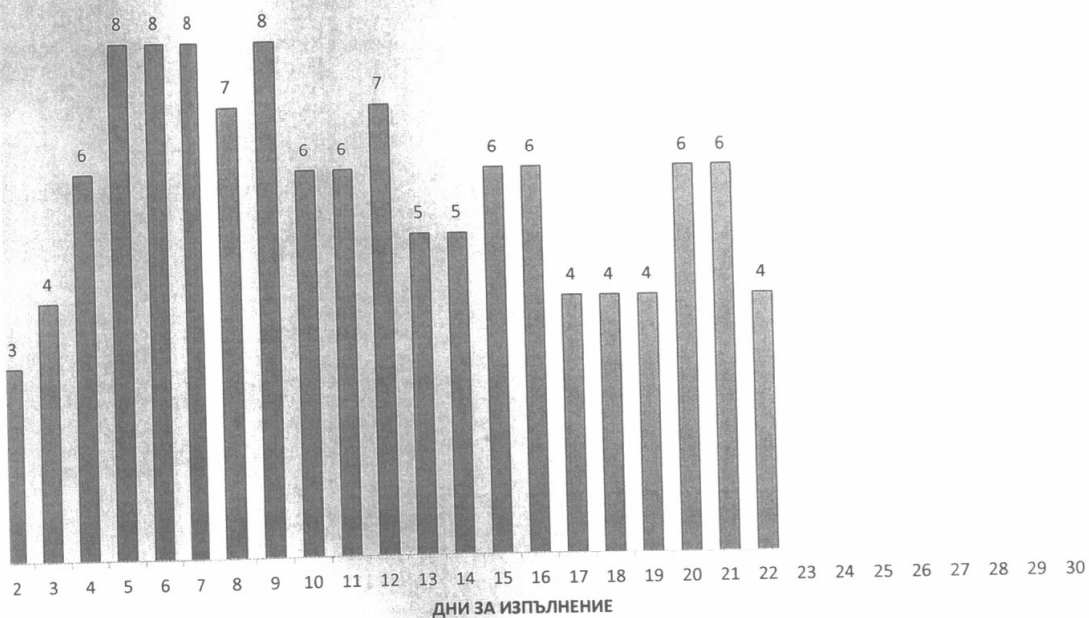

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж. Петър Василев
/подпис и печат/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
