


**КАЛЕНДАРЕН ГРАФ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОБЕКТ 8: ДАИ, гр. Монтана**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци				
						к.дни	1	2	3
	Вътрешен ремонт - помещения								
1	Покриване на под с полиетилен	м ²	100	1	1	1,0			
2	Изнасяне и внасяне на мебели	ч/ч	8	4	2	2,0			
3	Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни	м	155	6	2	3,0			
4	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	211,8	6	2	3,0			
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	211,8	6	2	3,0			
6	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	50	4	2	2,0			
7	Боядисване с бял латекс по тавани	м ²	110	4	2	2,0			
7	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	155	4	2	2,0			
8	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	4	2	2	1,0			
9	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	4	2	2	1,0			
10	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	100	2	2	1,0			
	СМР по фасади								
1	Тръбно фасадно скеле	м ²	384	9	3	3,0	3	3	
2	Сваляне на подкожушена мазлика по стени	м ²	192	6	2	3,0		2	2
3	Направа на шприц по стени	м ²	192	6	2	3,0			2
4	Направа на външна вароциментова мазилка по стени	м ²	192	9	3	3,0			
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	192	6	2	3,0			
6	Боядисване с цветен фасаген	м ²	192	6	2	3,0			
7	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	10	2	2	1,0			
8	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	10	2	2	1,0			
9	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	200	2	2	1,0			

3 5 4 7

Продължителност на изпълнение на СМР:19 (деветнадесет) календарни дни



Дата: 19.11.2015

Управлението



инж. Петър Василев
/подпис и печат/

/подпис и печат/

SOFIA


MEGATONS-1

КАЛЕНДАРЕН ГР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Н
ОБЕКТ 9: ДАИ, гр. Пв

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	Разрушаване на сграда							
1	Разрушаване на тухлени зидове	м ³	180	100	10	10,0		10
2	Разрушаване на стоманобетонова конструкция и покрив	м ³	60	60	10	6,0	10	10
3	Почистване и извозване на строителни отпадъци	м ³	240	60	10	6,0		

10 20

Продължителност на изпълнение на СМР: 19 (деветнадесет) календарни дни




Дата: 19.11.2015

**ГРАФИК
НА СМР
Първомай**

[Handwritten signature]

МЕСЕЦ 1																																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																	
0	10	10	10	10																													
					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																
10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10															

Диаграма на работната ръка

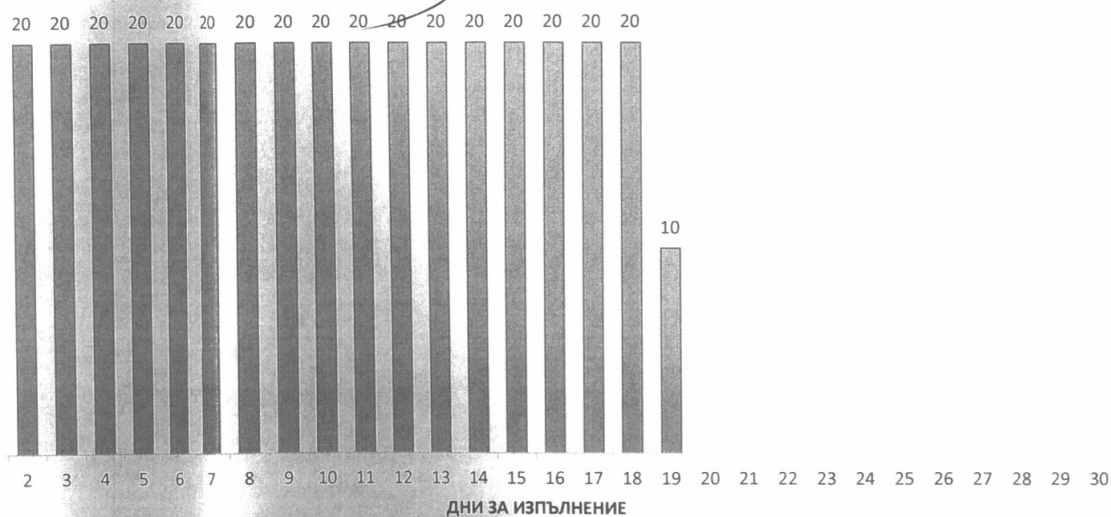

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж. Петър Василев
/подпис и печат/




[Handwritten signature]


КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ
ОБЕКТ 10: ДАИ, гр. Р

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	СМР по фасади							
1	Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета	м	68,00	1	1	1,0	1	
2	Очукване на подкожушена мазилка по фасада	м ²	200,00	6	2	3,0		2
3	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване	м	28,00	2	2	1,0		
4	Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м	28,00	2	2	1,0		
5	Демонтаж на климатици със запазване	бр.	3,00	2	2	1,0		
6	Монтаж на климатици със запазване	бр.	3,00	2	2	1,0		
7	Разбиване на подпрозоръчен перваз	м	20,00	2	2	1,0		
8	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с	м ²	476,00	32	4	8,0		
9	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от	м ²	476,00	32	4	8,0		
10	Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце	м	120,00	6	2	3,0		
11	Тръбно фасадно скеле	м ²	490,00	21	3	7,0	3	3
12	Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати	м	320,00	9	3	3,0		
13	Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати	м	120,00	6	2	3,0		
14	Доставка и монтаж на Al външни подпрозоръчни первази 25 см.	м	120,00	6	2	3,0		
15	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване	м	28,00	2	2	1,0		
16	Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м	28,00	2	2	1,0		
17	Демонтаж на поцинковани улици със запазване	м	68,00	4	2	2,0		
18	Монтаж на поцинковани улици със запазване	м	68,00	2	2	1,0		
19	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м ²	81,60	4	2	2,0		
20	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м ²	81,60	4	2	2,0		
21	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	20,00	4	2	2,0		
22	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	20,00	6	2	3,0		
23	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	200,00	4	2	2,0		
24	Доставка и монтаж на PVC дограма- със стъклопакет 24 мм / витрина/	м ²	10,00	2	2	1,0		
	Вътрешен ремонт -помещения							
1	Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка	м ²	100,00	2	1	2,0		
2	Демонтаж на дървена врата	бр	5,00	2	2	1,0		
3	Доставка и монтаж на врати- AL профил с термопанел	м ²	9,00	4	2	2,0		
4	Демонтаж на ламперия	м ²	30,00	2	2	1,0		
5	Демонтаж на осветителни тела	бр.	30,00	2	2	1,0		
6	Демонтаж на метално Ел табло	бр.	2,00	2	2	1,0		
7	Подмяна на стара дървена догрма с нова – PVC профил, петкамерен, цвят бял, стъклопакет 24 мм	м ²	3,60	2	2	1,0		
8	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	420,00	21	3	7,0		
9	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	420,00	15	3	5,0		
10	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	420,00	15	3	5,0		
11	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	420,00	15	3	5,0		
12	Направа н гишетура от PVC дограма	м ²	8,40	4	2	2,0		
13	Направа на преградна стена от гипскартон - пожароустойчив	м ²	17,20	4	2	2,0		
14	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата IP 90	м ²	1,80	2	2	1,0		
15	Доставка и сглобяване на метални стелажи	м ³	30,00	4	2	2,0		
16	Доставка и монтаж на климатик инверторен BTU 12000	бр.	1,00	2	2	1,0		
17	Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лайсни	м	80,00	4	2	2,0		

МЕСЕЦ 1

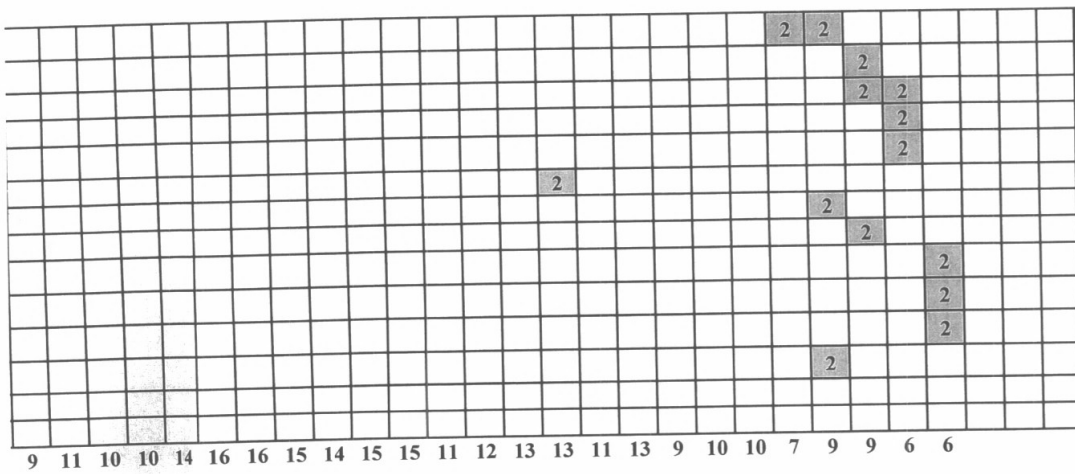

Диаграма на работната ръка

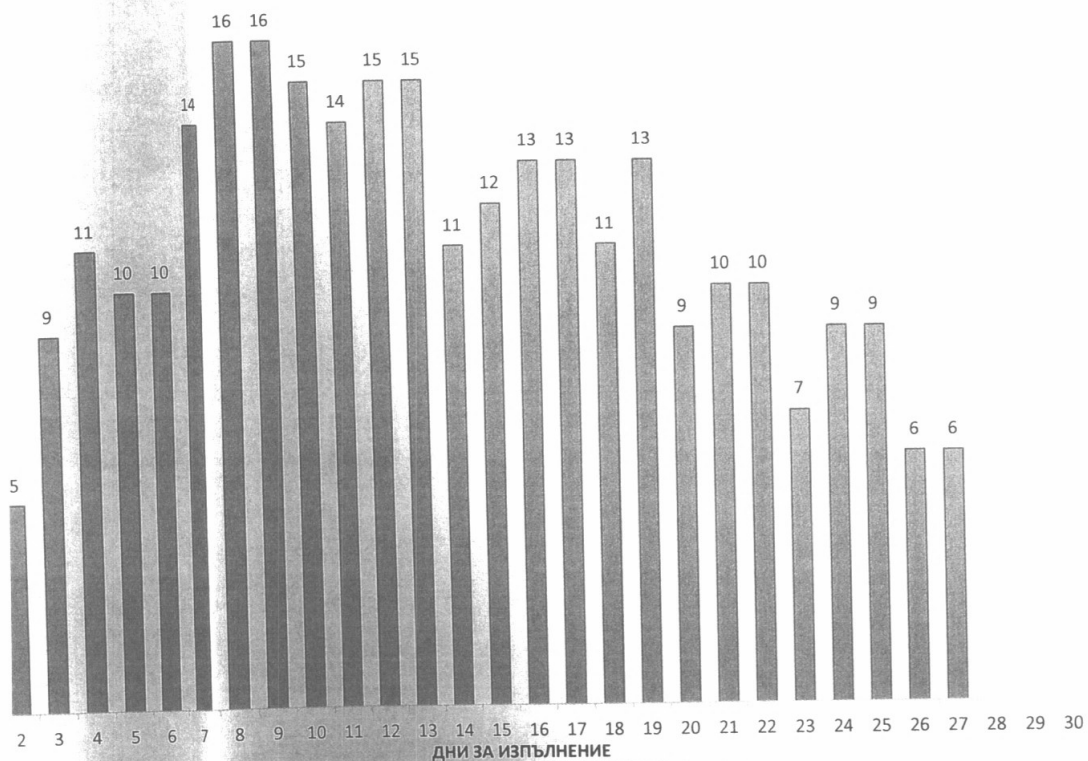

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж. Петър Василев

/подпис и печат/



**КАЛЕНДАРЕН ГР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЕКТ 11: ДАИ, гр.**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	СМР по ФАСАДИ							
1	Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета	м	50,00	2	2	1,0	2	
2	Тръбно фасадно скеле	м ²	180,00	6	3	2,0		3
3	Очукване на подкожушена мазилка по фасада	м ²	180,00	9	3	3,0		
4	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	180,00	9	3	3,0		
5	Направа на шприц	м ²	180,00	6	2	3,0		
6	Направа на външна вароциментова мазилка по стени	м ²	180,00	9	3	3,0		
7	Боядисване с цветен фасаген	м ²	180,00	9	3	3,0		
8	Демонтаж на стара хидроизолация по козирка	м ²	20,00	2	2	1,0		
9	Направа на изравнителна армирана цименто-пясъчна замазка до 4 см. по	м ²	20,00	2	2	1,0		
10	Доставка и полагане на хидроизолация АРР - два пласта на газопламъчно	м ²	20,00	2	2	1,0		
11	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	10,00	2	2	1,0		
12	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	10,00	2	2	1,0		
13	Почистване на строителня площадка и прилежащи площи	м ²	100,00	4	2	2,0		
	Вътрешен ремонт							
1	Покриване на под с полиетилен	м ²	50,00	1	1	1,0		
2	Изнасяне и внасяне на мебели	ч/ч	10,00	4	2	2,0		
3	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	264,00	12	3	4,0		
4	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	264,00	9	3	3,0		
5	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	100,00	9	3	3,0		
6	Боядисване бял латекс по тавани	м ²	64,00	6	3	2,0		
7	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	200,00	9	3	3,0		
8	Демонтаж на осветителни тела	бр	3,00	2	2	1,0		
9	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	3,00	2	2	1,0		
10	Направа на гишетура в ламинатна врата	бр.	1,00	4	2	2,0		
11	Доставка и монтаж на AL щори- хоризонтали	м ²	16,70	1	1	1,0		
12	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	2,00	1	1	1,0		
13	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	2,00	1	1	1,0		
14	Почистване на строителня площадка и прилежащи площи	м ²	50,00	2	2	1,0		
15	Подмяна на тоалетно казанче	бр	4,00	1	1	1,0		

2 3

Продължителност на изпълнение на СМР:24 (двадесет и четири) календарни дни

ly





Дата: 19.11.2015

MB

Диаграма на работната ръка



Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж. Петър Василев

/подпис и печат/



Handwritten signature of the manager.


Handwritten signature.

**КАЛЕНДАРЕН ГР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В
ОБЕКТ 12: ДАИ, гр.**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	Ремонт на покрив							
1	Доставка и монтаж на LT ламарина по съществуващ покрив на навес (за кърпежи).	м²	30,00	4	2	2,0	2	2
2	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по борд по същ. покрив – за кърпежи	м²	15,00	4	2	2,0		
3	Демонтаж на окачен таван	м²	18,00	2	2	1,0		
4	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг	м²	18,00	2	2	1,0		
5	Запълване на отоври с пяна	бр.	10,00	1	1	1,0		
6	Демонтаж на тоалетно казанче	бр.	1,00	1	1	1,0		
7	Доставка и монтаж на тоалетно казанче	бр.	1,00	1	1	1,0		

2 2

Продължителност на изпълнение на СМР:7 (седем) календарни дни




Дата: 19.11.2015

у

[Handwritten signature]

МЕСЕЦ 1																																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
2	2																																
	2	2																															
		2																															
			2	2																													
				1	1																												
					1																												
						1																											
							1																										
2	4	4	3	3	2																												

Диаграма на работната ръка

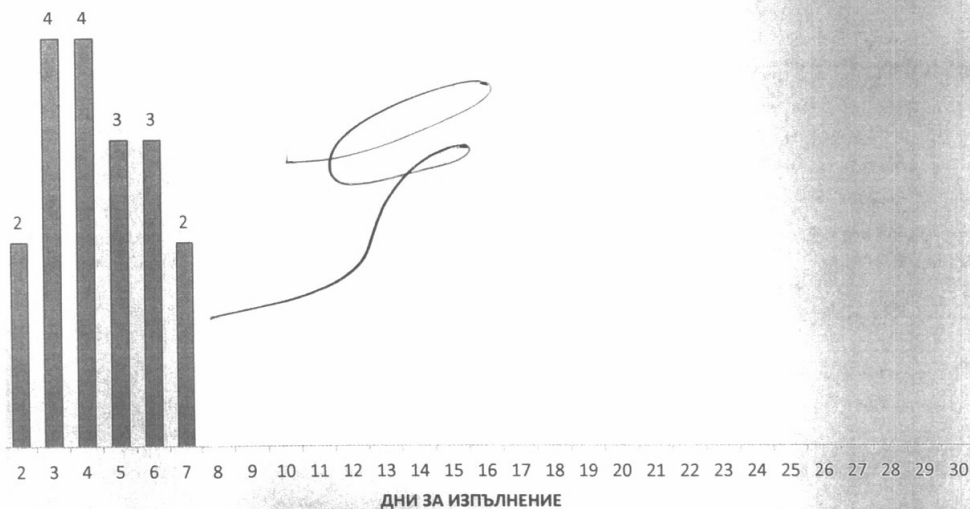

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж. Петър Василев

/подпис и печат/




[Handwritten signature]

**КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ
ОБЕКТ 13: ДАИ, гр. Търговище**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	Вътрешен ремонт							
1	Покриване на под с полиетилен	м ²	100,00	1	1	1,0		
2	Демонтаж на балатум с изчистване на лепилото от подовата замазка	м ²	82,00	2	2	1,0	2	
3	Демонтаж на тапети	м ²	29,00	1	1	1,0	1	
4	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	176,00	8	2	4,0		
5	Демонтаж на осветителни тела	бр	15,00	2	2	1,0		2
6	Подмяна на панти брава, патрон дръжки на дървена врата	бр	5,00	4	2	2,0		
7	Стъргане на блажна боя по стари дървени врати	м ²	24,00	6	2	3,0		
8	Полагане на блажна боя по стари дървени врати	м ²	24,00	6	2	3,0		
9	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	80,00	6	2	3,0		
10	Оформяне на ръбове с гипс и алуминиеви лисни	м	60,00	4	2	2,0		
11	Боядисване с бял латекс по тавани	м ²	55,00	4	2	2,0		
12	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	121,00	4	2	2,0		
13	Доставка и полагане на тапети	м ²	29,00	4	2	2,0		
14	Направа на саморазливна замазка	м ²	82,00	6	3	2,0		
15	Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас АС-32	м ²	82,00	4	2	2,0		
16	Доставка и монтаж на PVC превази	м	75,00	4	2	2,0		
17	Блажно боядисване на метални гаражни врати с предврително почистване на	м ²	77,25	8	2	4,0		
18	Подмяна на стъкла до 5 мм	м ²	2,00	2	2	1,0		
19	Доставка и сглобяване на метални стилажи	м ³	16,00	4	2	2,0		
20	Доставка и монтаж на AL щори – хоризонтални	м ²	12,00	2	2	1,0		
21	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	15,00	2	2	1,0		
22	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м3	10,00	2	2	1,0		
23	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м3	10,00	2	2	1,0		
24	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м2	100,00	2	2	1,0		

3 3

Продължителност на изпълнение на СМР:25 (двадесет и пет) календарни дни



Дата: 19.11.2015

Уп



инж. **Петър Василев**
/подпис и печат/


**КАЛЕНДАРЕН ГР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЕКТ 14: ДАИ, гр. ...**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци			
						к.дни	1	2
	Ремонт на складове							
1	Товарене, разтоварване и пълнене на съществуващи отпадъци в чували	м ³	20,00	6	2	3,0		
2	Извозване на съществуващи смесени отпадъци с включени такси сметище	м ³	20,00	4	2	2,0		
3	Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка	м ²	128,00	2	2	1,0	2	
4	Сваляне на подкожушена мазлика по стени и тавани	м ²	350,00	10	2	5,0		2
5	Подмяна на стара дървена догрма с нова – PVC профил, петкамерен, цвят бял, стъклопакет 24 мм	м ²	12,80	4	2	2,0		2
6	Подмяна на входни врати с нови - AL профил със стъклопакет 24 мм.	м ²	9,00	4	2	2,0		
7	Обръщане от вътре около прозорци на подменена дограма	м	88,00	4	2	2,0		
8	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	350,00	12	3	4,0		
9	Направа на шприц по стени и тавани	м ²	350,00	12	3	4,0		
10	Вароциментова мазилка по стени и тавани	м ²	350,00	15	3	5,0		
11	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	350,00	15	3	5,0		
12	Боядисване с цветен латекс по стени и тавани	м ²	350,00	15	3	5,0		
13	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	128,00	1	1	1,0		
14	Направа на цименто-пясъчна замазка по под с дебелина до 4 см.	м ²	128,00	9	3	3,0		
15	Доставка и полагане на плочки от гранитогрес	м ²	128,00	12	3	4,0		
16	Направа на цокъл от гранитогрес	м	88,00	9	3	3,0		
17	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	15,00	4	2	2,0		
18	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	15,00	4	2	2,0		
19	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	35,00	4	2	2,0		
	Фасади на складове							
20	Сваляне на подкожушена мазлика по стени и тавани	м ²	80,00	12	3	4,0		
21	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	180,00	12	3	4,0		
22	Направа на шприц по стени и тавани	м ²	180,00	8	2	4,0		
23	Направа на външна вароциментова мазилка по стени	м ²	180,00	9	3	3,0		
24	Боядисване с цветен фасаген	м ²	180,00	9	3	3,0		
25	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	5,00	6	2	3,0		
26	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	5,00	2	2	1,0		
27	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	97,00	4	2	2,0		
	Електроинсталация							
28	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2	м	148,00	4	2	2,0		
29	Доставка и полагане на кабел канал 40x25	м	148,00	6	2	3,0		
30	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	10,00	4	2	2,0		

2 4

Продължителност на изпълнение на СМР:28 (двадесет и осем) календарни дни






Дата: 19.11.2015

Уп

[Handwritten signature]

Диаграма на работната ръка

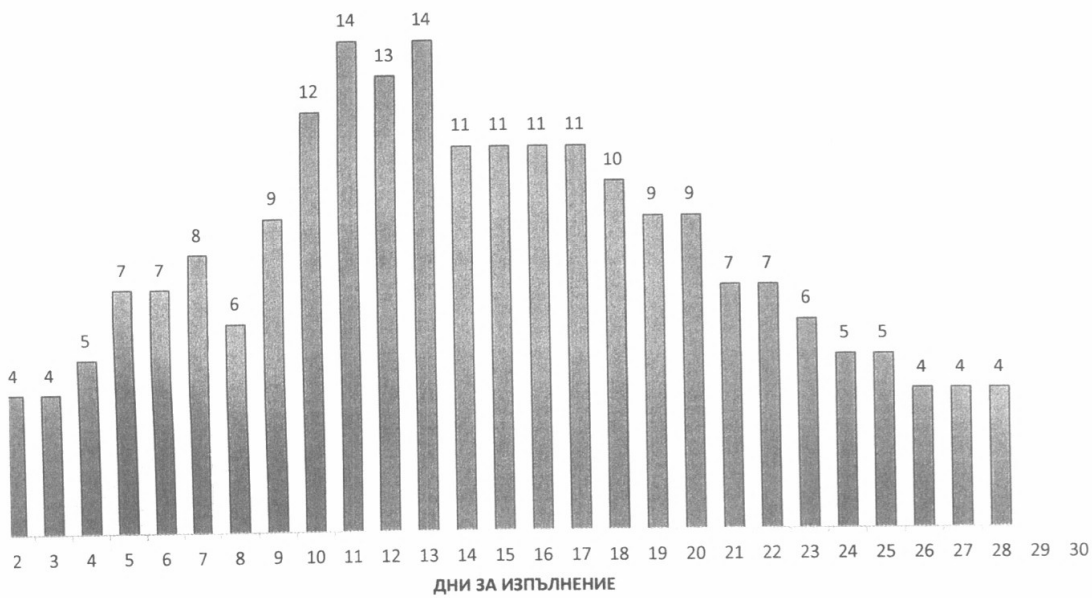

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

инж.Петър Василев
/подпис и печат/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


**КАЛЕНДАРЕН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИ
ОБЕКТ 15: ДАИ,**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци							
						к.дни	1	2	3	4	5	6
	СМР по фасади											
1	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване	м	61,04	4	2	2,0		2	2			
2	Демонтаж на поцинковани улици със запазване	м	140,00	4	2	2,0			2	2		
3	Демонтаж на поцинковани водосточни казанчета със запазване	бр	7,00	2	2	1,0		2				
4	Демонтаж на поцинкована ламарина по покривен борд	м	99,00	4	2	2,0				2	2	
5	Тръбно фасадно скеле	м ²	1220,00	60	4	15,0	4	4	4	4	4	4
6	Очукване на подкожушена мазилка по фасада	м ²	488,00	21	3	7,0			3	3	3	3
7	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м ²	842,25	72	6	12,0						6
8	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м ²	138,10	4	2	2,0				2	2	
9	Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати	м	383,90	16	2	8,0						
10	Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати	м	177,90	18	2	9,0						
11	Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м	561,80	32	4	8,0						
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS	м ²	842,25	66	6	11,0						
13	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м ²	138,10	4	2	2,0						
14	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на отвори по топлоизолация от EPS	м	561,80	33	3	11,0						
15	Доставка и монтаж на Al външни подпрозоречни первази 25 см.	м	165,50	4	2	2,0						
16	Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м	61,04	4	2	2,0						
17	Монтаж на поцинковани улици със запазване	м	140,00	4	2	2,0						
18	Монтаж на поцинковани водосточни казанчета със запазване	бр	7,00	2	2	1,0						
19	Доставка и монтаж на нови барабани	бр	5,00	2	2	1,0						
20	Направа на борд от газобетон - 1 ред от 15 см. газобетонен блок	м	12,00	2	1	2,0						
21	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламаринена по бордове	м	111,00	2	2	1,0						
22	Подмяна на стара дървена и метална догрма с нова - петкамерен PVC профил, цвят бял, стъклопакет 24 мм.	м ²	249,39	18	3	6,0				3	3	3
23	Обръщане от вътре около прозорци на подменена дограма	м	502,00	18	3	6,0				3	3	3
24	Подмяна на входни врати с нова дограма – Al профил със стъклопакет 24 мм	м ²	7,28	2	2	1,0			2			
25	Блажно боядисване на гаражни метални врати с предврително почистване на ръжда и грундиране	м ²	77,25	6	2	3,0						
26	Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци	м ³	15,00	6	2	3,0						
27	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	15,00	6	2	3,0						
	Вътрешен ремонт											
1	Изнасяне и внасяне на мебели	ч/ч	30,00	6	2	3,0						
2	Демонтаж на тапети	м ²	33,64	1	1	1,0						
3	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	475,65	15	3	5,0						
4	Изкърпване с гипсова шпакловка	м ²	142,70	15	3	5,0						
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	475,65	15	3	5,0						
6	Боядисване с бял латекс по тавани	м ²	175,00	8	2	4,0						
7	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	300,00	8	2	4,0						
8	Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка	м ²	137,19	4	2	2,0						
9	Направа на самонивелираща замазка	м ²	137,19	4	2	2,0						
10	Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас AC-32	м ²	137,19	4	2	2,0						
11	Доставка и монтаж на PVC превази	м	146,92	4	2	2,0						
12	Прогонка на дървени врати	бр	12,00	4	2	2,0						
13	Подмяна на панти, брава, патрон и дръжка на дървена врата	бр	12,00	4	2	2,0						
	Част: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ											
	Преработка на ГРТ											
1	Доставка и монтаж на АП 16А, 1Р	бр.	18,00	1	1	1,0						
2	Доставка и монтаж на АП 63А, 3Р	бр.	3,00	1	1	1,0						
3	Доставка и монтаж на 3Р гребен	м	1,00	1	1	1,0						
4	Доставка и монтаж на DIN шина	м	1,00	1	1	1,0						

5	Доставка и монтаж на нулева шина	м	0,50	1	1	1,0													
6	Доставка и монтаж на шина земя	м	0,50	1	1	1,0													
7	Доставка и полагане на кабел ПВА2 16 мм2	м	6,00	1	1	1,0													
Силова инсталация 1-ви и 2-ри етажи																			
1	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5 мм2	м	492,00	12	2	6,0													
2	Доставка и монтаж на контакти "Шуко"	бр.	8,00	1	1	1,0													
3	Доставка и монтаж на контакти "Шуко", троен	бр.	18,00	1	1	1,0													
4	Доставка и полагане на кабел канал 40x25	м	246,00	9	3	3,0													
5	Пробиване на отвори	бр.	10,00	1	1	1,0													
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4 мм2	м	25,00	4	2	2,0													
7	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4 мм2	м	20,00	4	2	2,0													
8	Доставка и монтаж на контакти "Шуко", двоен	бр.	3,00	1	1	1,0													
9	Доставка и монтаж на контакт трифазен	бр.	1,00	1	1	1,0													
Осветителна инсталация 1-ви и 2-ри етажи																			
1	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	24,00	4	2	2,0													
2	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2	м	48,00	2	1	2,0													
3	Демонтаж на осветително тяло	бр.	24,00	1	1	1,0													
Нова ограда към бул. "Ришки проход" - изпълнение по обект																			
1	Проектиране на нова ограда с р-ри L= 300 м и Н=2,50 м, с всички необходими части на проекта, Одобряване и Разрешение за строеж	бр.	1,00	1	1	1,0	1												
2	Демонтаж на стари метални пана и метални врати	бр.	29,00	9	3	3,0													
3	Разкъртване на стара зидария от бетонови блокове и стоманобетон	м ³	10,00	12	3	4,0													
4	Траншеев изкоп с дълбочина 40 см. за основи ограда	м	67,00	10	2	5,0													
5	Котважи за нови стени	м ²	152,00	10	2	5,0													
6	Доставка и полагане на арматура	кг	1250,00	10	2	5,0													
7	Доставка и полагане на бетон С 15/20	м ³	17,50	8	2	4,0													
8	Доставка и монтаж на оградни пана	бр.	26,00	4	2	2,0													
9	Доставка и монтаж на входна врата /за автомобили/- 300/250 см, стоманени профили	бр.	1,00	2	2	1,0													
10	Доставка и монтаж на входна врата /пътна/ - 100/200см, стоманени профили	бр.	1,00	2	2	1,0													
11	Боядисване на стоманени елементи с боя три в едно	м ²	86,54	4	2	2,0													
12	Натоварване и разтоварване на строителни отпадъци	м ³	12,00	4	2	2,0													
13	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	12,00	4	2	2,0													


5 8 16 19 17 19 2

Продължителност на изпълнение на СМР:40 (четиридесет) календарни дни

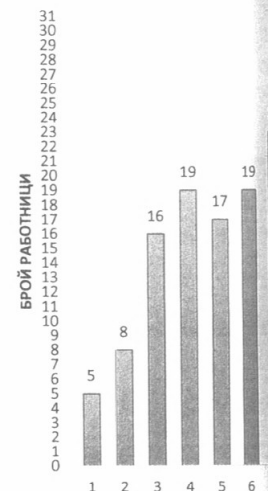


Дата: 19.11.2015

Управител, "Мег

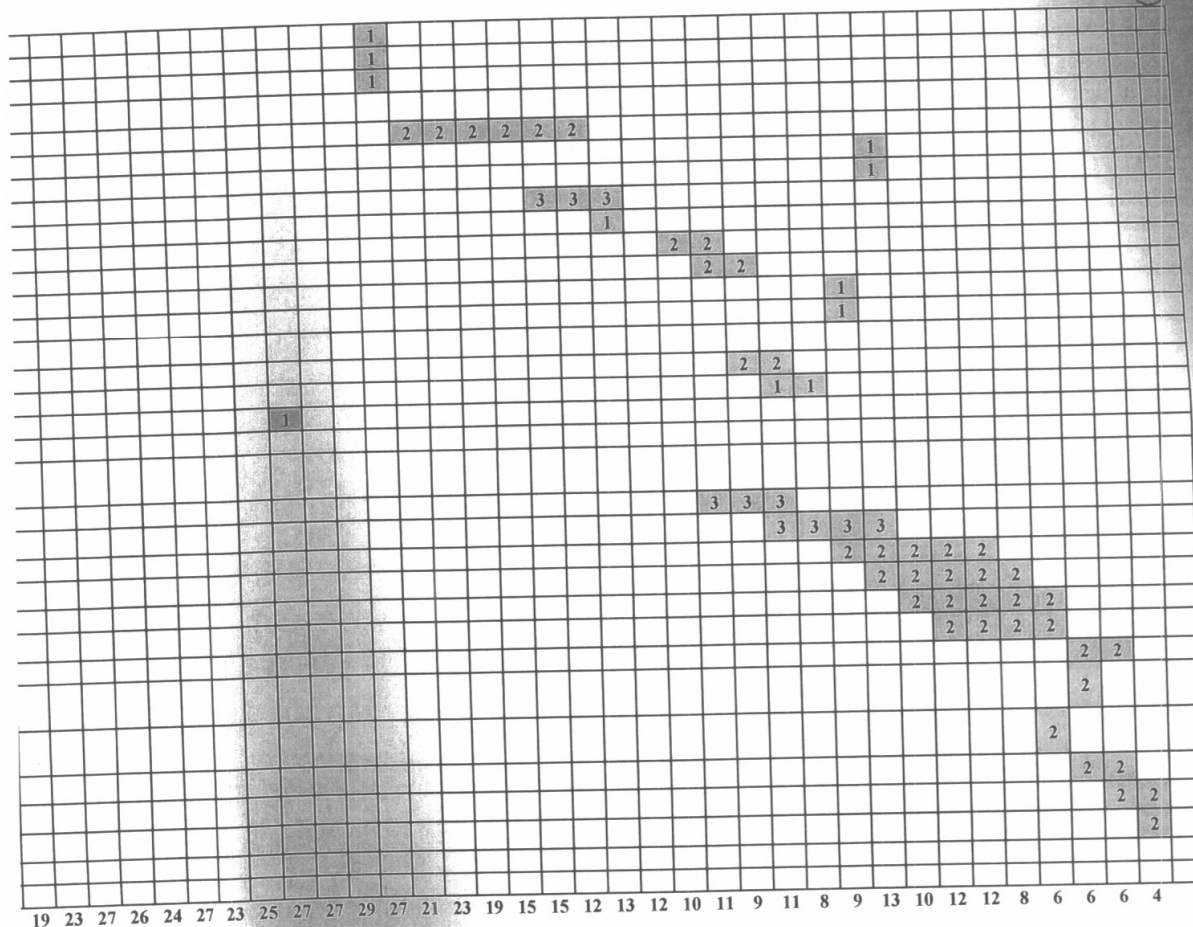

Диаграма на работната ръка

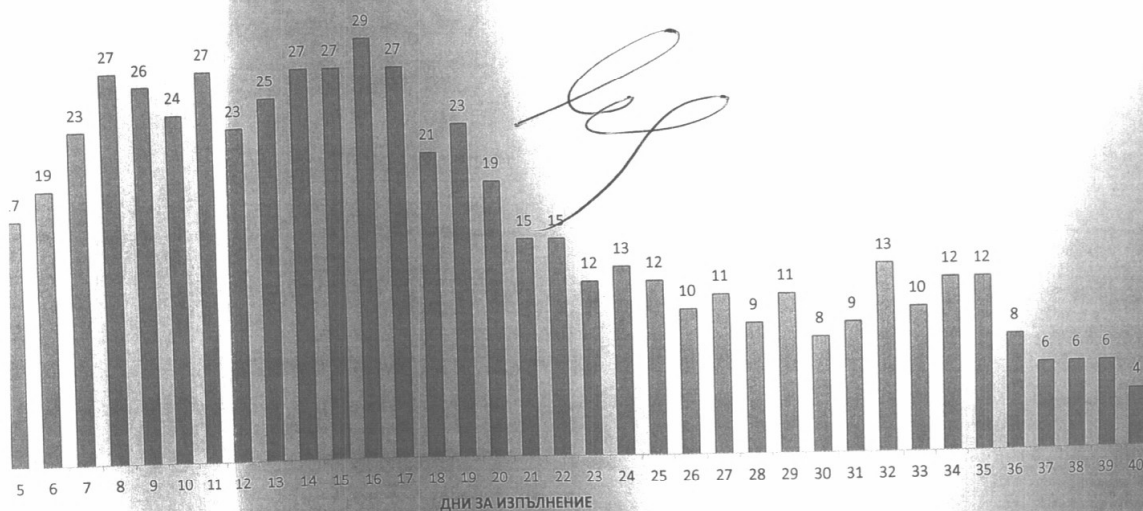

л, "Мегатурс 1" ЕООД

инж.Петьо Василев

/подпис и печать


**КАЛЕНДАРЕН ГРА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЕКТ 16: ДАИ, гр. Я**

№	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	К-во	ч.дни /м.см/	брой р-ци				
						к.дни	1	2	3
Вътрешен ремонт									
1	Демонтаж на балатум с ичистване на лепилото от подовата замазка	м ²	280,00	9	3	3,0			
2	Стъргане на постна боя от стени и тавани	м ²	716,00	20	4	5,0			
3	Демонтаж на осветителни тела	бр	50,00	4	2	2,0			
4	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	380,00	15	3	5,0			
5	Демонтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглас"	м ²	100,00	2	2	1,0			
6	Доставка и монтаж на очкачен таван тип "Армстронг"	м ²	100,00	4	2	2,0			
7	Демонтаж на ключове	бр	20,00	2	1	2,0			
8	Демонтаж на контакти	бр	40,00	2	1	2,0			
9	Доставка и монтаж на контакти "Шуко" за скрит монтаж в гипсокартон	бр.	40,00	2	2	1,0			
10	Доставка и монтаж на ключове за скрит монтаж в гипсокартон	бр.	20,00	4	2	2,0			
11	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	50,00	4	2	2,0			
12	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	716,00	15	3	5,0			
13	Боядисване с бял латекс по тавани	м ²	216,00	8	2	4,0			
14	Боядисване с цветен латекс по стени	м ²	500,00	18	3	6,0			
15	Полагане на блажна боя по цокъл	м ²	35,00	2	1	2,0			
16	Направа на самонивелираща замазка	м ³	280,00	8	2	4,0			
17	Доставка и монтаж на ламиниран паркет- d=8мм, клас AC-32	м ²	280,00	6	2	3,0			
18	Доставка и монтаж на външни, подпрозоречни PVC первази	м	260,00	4	2	2,0			
19	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	20,00	4	2	2,0			
20	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	20,00	4	2	2,0			
Фасади									
1	Обезопасяване на обекта със сигнална лента на метални колчета	м	70,00	1	1	1,0			
2	Очукване на подкожухена мазилка по фасада	м ²	88,00	4	2	2,0			
3	Тръбно фасадно скеле	м ²	422,00	21	3	7,0	3	3	
4	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 8 см. на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м ²	422,00	20	4	5,0			
5	Обръщане на врати и прозорци с 2 см. EPS на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м	150,00	4	2	2,0			
6	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада по топлоизолация от EPS	м ²	422,00	24	4	6,0			
7	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м ²	45,00	4	2	2,0			
8	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламаринена по бордове	м	66,00	4	2	2,0			
9	Демонтаж на поцинковани улици със запазване	м	66,00	4	2	2,0	2	2	
10	Монтаж на поцинковани улици със запазване	м	66,00	4	2	2,0			
11	Демонтаж на поцинковани водосточни тръби със запазване	м	28,00	4	2	2,0			2
12	Монтаж на поцинковани водосточни тръби	м	28,00	4	2	2,0			
13	Доставка и монтаж на Al външни подпрозоръчни первази 25 см.	м	100,00	4	2	2,0			
14	Доставка и монтаж на ръбохранител по ръбове на топлоизолация при прозорци и врати	м	120,00	4	2	2,0			
15	Доставка и монтаж на PVC водокапи при прозорци и врати	м	50,00	4	2	2,0			
16	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 4 см. при цокъл на лепене и дюбелиране с две ръце шпакловка със стъклофибърна мрежа по фасада	м ²	79,00	4	2	2,0			
17	Доставка и полагане на структурна мазилка по цокъл по топлоизолация от XPS	м ²	79,00	4	2	2,0			
18	Товарене, разтоварване и пълнене на строителни отпадъци в чували	м ³	28,00	6	2	3,0			
19	Извозване на строителни отпадъци с включени такси сметище	м ³	28,00	6	2	3,0			
20	Почистване на строителна площадка и прилежащи площи	м ²	350,00	6	3	2,0			
Ново външно електро-захранване от съществуващо ел. табло									

1	Трасиране каб. линия в равнинен терен	км	0,04	1	1	1,0		
2	Направа изкоп 0,8/0,4 m - IV катег.	м	10,00	1	1	1,0		
3	Направа изкоп 1.0/0.4m - IV катег.	м	30,00	2	1	2,0		
4	Доставка и монтаж на предпазна гофрирана негорима тръба ф40 mm	м	3,00	2	2	1,0		
5	Доставка и монтаж предпазна стоманена тръба ф40 mm - по стена	м	3,00	2	2	1,0		
6	Доставка кабел 1 кV тип NAYY 4x35 mm ²	м	62,00	2	2	1,0		
7	Изтегляне на кабел NAYY 4x35 mm ² в монтирана тръба	м	42,00	2	2	1,0		
8	Полагане на кабел NAYY 4x35 mm ² - свободно в изкоп и покриване със сигнална полимерна лента	м	10,00	2	2	1,0		
9	Полагане на кабел NAYY 4x35 mm ² - по скоби	м	10,00	2	2	1,0		
10	Направа на отвор в тухлена стена до 10/10 см	бр	1,00	2	2	1,0		
11	Суха разделка на кабел NAYY 4x35 mm ²	бр	2,00	2	2	1,0		
12	Свързване на проводник към съоразение до 35 mm ²	бр	8,00	2	2	1,0		
13	Демонтаж на проводник от съоразение до 35 mm ²	бр	8,00	2	2	1,0		
14	Ремонт на заземление	бр	1,00	2	2	1,0		
15	Замерване на заземление	бр	1,00	2	2	1,0		
16	Монтаж на кабелни марки	бр	2,00	2	2	1,0		
17	Изпитване на кабел 1 кV с повишено напрежение	бр	1,00	2	2	1,0		
18	Сфазирание краищата на кабел 1 кV	бр	2,00	2	2	1,0		

5 7


Продължителност на изпълнение на СМР:29 (двадесет и девет) календарни дни




Дата: 19.11.2015

Уп

[Handwritten signature]

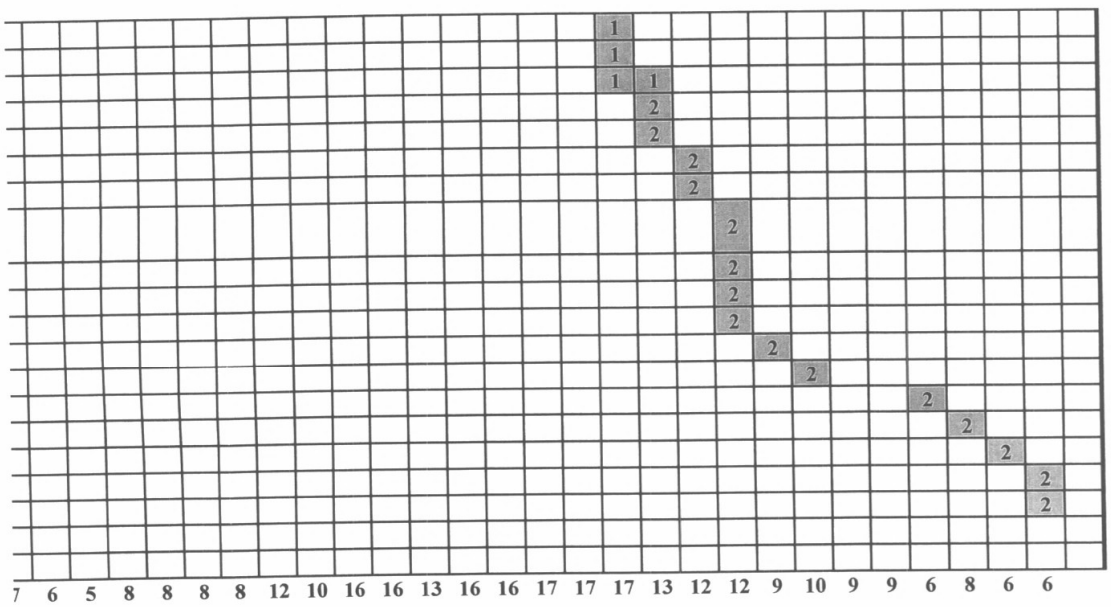

[Handwritten signature]
Диаграма на работната ръка

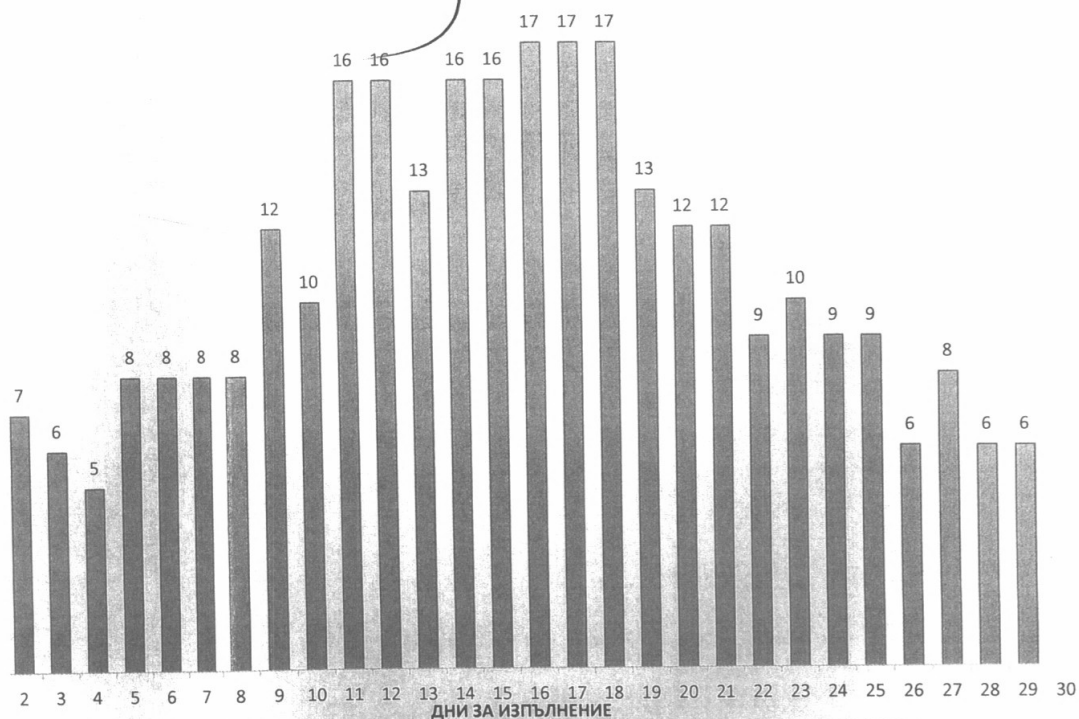

Управител, "Мегатурс 1" ЕООД

[Handwritten signature]
инж. Петър Василев
/подпис и печат



[Handwritten signature]
